



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO PIAUI
Rua Eurípedes Borges, S/N, Centro - CEP: 64.615-000
Santana do Piauí - PI
CNPJ Nº 41.522.137/0001-93
www.santanadopiaui.pi.gov.br



PROJETO BÁSICO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM
PARALELEPÍEDO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO PIAUÍ - PI

Ronald de Matos Sousa
Ronald de Matos Sousa
Eng.º Civil
CREA NAC 191039745-8
CREAPI 22589



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO PIAUI
Rua Eurípedes Borges, S/N, Centro - CEP: 64.615-000
Santana do Piauí - PI
CNPJ Nº 41.522.137/0001-93
www.santanadopiaui.pi.gov.br



SUMARIO

1.0 - APRESENTAÇÃO

2.0 - METAS

3.0 - MEMORIAIS DESCRITIVOS

4.0 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

5.0 - CUSTOS


- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
- MEMORIAL DE CALCULO
- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
- COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
- LEIS SOCIAIS
- BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDERETAS - BDI

6.0 - PLANTAS TÉCNICAS

7.0 - LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

8.0 - ANEXOS

Ronald de Matos Sousa
Ronald de Matos Sousa
Eng.º Civil
CREA/NA 191039745-6
CREA/PI 22589



EM BRANCO



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO PIAUÍ
Rua Eurípedes Borges, S/N, Centro - CEP: 64.615-000
Santana do Piauí - PI
CNPJ Nº 41.522.137/0001-93
www.santanadopiaui.pi.gov.br




1 - APRESENTAÇÃO

O presente projeto faz parte do Plano de Ação proposto por esta administração, que prevê a pavimentação de vias públicas na zona urbana e rural do município de SANTANA DO PIAUÍ - PIAUÍ. A fim de assegurar a execução deste projeto, cuja principal meta é levar benfeitorias para as comunidades mais carentes do município, a PREFEITURA vem solicitar financiamento da obra em questão.

A implantação de pavimentação em paralelepípedo nas ruas do município tem como objetivo melhorar a qualidade de vida da população uma vez que o pavimento de paralelepípedos é considerado ecologicamente correto, pois permitem a infiltração da água de chuva recarregando o lençol freático e minimizando os efeitos de enchentes. Além de absorver menos calor, propiciam o crescimento de determinadas gramíneas que, além de ajudar a diminuir a temperatura, captam CO₂ que é expelido pelos carros, partículas coloidais carregadas de nutrientes que poluem os cursos d'água.

Ronald de Matos Sousa
Ronald de Matos Sousa
Engº Civil
CREA NAC 191039745-8
CREAPI 22589



EM BRANCO



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO PIAUÍ
Rua Eurípedes Borges, S/N, Centro - CEP: 64.615-000
Santana do Piauí - PI
CNPJ Nº 41.522.137/0001-93
www.santanadopiaui.pi.gov.br



2 - METAS

O projeto que ora se apresenta, trata-se de pavimentação em paralelepípedo na sede do município de SANTANA DO PIAUÍ - PI, contemplando a seguinte rua:

- São Pedro

Totalizando uma área de 2.675,00 metros quadrados = 535,00 x 5,00 metros.

EM BRANCO

Ronald de Matos Sousa
Ronald de Matos Sousa
Engº Civil
CREA NAC 191039745-0
CREAPI 22589

EM BRANCO




3. MEMORIAL DESCRITIVO

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras.


Durante a obra será feita periódica remoção de todo entulho e detritos que venham a se acumular no local.

Competirá a empreiteira fornecer todo as ferramentas, instalações provisórias, maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita execução dos serviços contratados.

Qualquer dúvida na especificação, caso algum material tenha saído de linha durante a obra, ou ainda caso faça opção pelo uso de algum material equivalente, consultar a Fiscalização de Obras que, se necessário, buscará junto aos departamentos e divisões na Rede Física o apoio para essa definição e para maiores esclarecimentos a fim de que a obra mantenha o mesmo padrão de qualidade, em todos os níveis da edificação.



ESTADO DE PIAJE
PRETETURA MUNICIPAL DE SAN TARA DO PIAJE
Rua dos Bombeiros, s/n, Centro - Pinar del Rio
CNPJ nº 07.000.000/0001-91
Este documento emite-se em duas vias.



EM BRANCO



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO PIAUÍ
Rua Eurípedes Borges, S/N, Centro - CEP: 64.615-000
Santana do Piauí - PI
CNPJ Nº 41.522.137/0001-93
www.santanadopiaui.pi.gov.br



SANTANA DO PIAUÍ - PI


1.0 - Localização:

O município está localizado na microrregião de Picos (figura 2), compreendendo uma área irregular de 155 km², tendo como limites os municípios de São Jose do Piauí a norte, a sul com Picos, a oeste com Picos, Dom Expedito Lopes e Ipiranga do Piauí e, a leste com Sussuapara. A sede municipal tem as coordenadas geográficas de 06º 56'52" de latitude sul e 41º 31'07" de longitude oeste de Greenwich e dista cerca de 324 Km de Teresina.

2.0 - Aspectos Socioeconômicos

Os dados socioeconômicos relativos ao município foram obtidos a partir de pesquisa nos sites do IBGE (www.ibge.gov.br) e do Governo do Estado do Piauí (www.pi.gov.br). O município foi criado pela Lei Estadual nº 1.477, de 29/04/1992, sendo desmembrado do município de Picos. A população total, segundo o Censo 2000 do IBGE, é de 4.595 habitantes e uma densidade demográfica de 29,65 hab/km², onde 61,85% das pessoas estão na zona rural. Com relação a educação, 61,40% da população acima de 10 anos de idade é alfabetizada. A sede do município dispõe de abastecimento de água, energia elétrica distribuída pela Companhia Energética do Piauí S/A - CEPISA, terminais telefônicos atendidos pela TELEMAR Norte Leste S/A, agencia de correios e telégrafos e escola de ensino fundamental. A agricultura praticada no município é baseada na produção sazonal de feijão, mandioca e milho.

Ronald de Matos Sousa
Ronald de Matos Sousa
Eng.º Civil
CREANAC 191039745-E
CREA/PI 22589



Município de São Paulo
Secretaria Municipal de Planejamento
e Desenvolvimento Urbano

Processo Administrativo nº 123456789

12 de maio de 2024

Prezados Senhores,

Em atenção ao requerimento nº 123456789, de 10 de maio de 2024, referente ao pedido de liberação de terreno para a construção de uma obra, informamos que o mesmo encontra-se em fase de análise técnica.

Conforme consta no processo, o terreno em questão possui as seguintes características:

- Área total: 1000 m²
- Área construída: 500 m²
- Altura máxima: 3,00 m

Para a liberação do terreno, é necessário que o requerente apresente o projeto arquitetônico e o projeto de fundação, devidamente aprovados pelo Conselho Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano.

Atenciosamente,

EM BRANCO

123456789 - 123456789

Este documento é uma cópia digitalizada de um documento original. O conteúdo aqui apresentado é apenas para fins de referência e não deve ser utilizado para fins legais ou administrativos. Qualquer alteração ou modificação no texto original não será refletida aqui.

Assinatura: _____

Nome: _____

Cargo: _____

Local: _____

Data: _____



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO PIAUÍ
Rua Eurípedes Borges, S/N, Centro - CEP: 64015-000
Santana do Piauí - PI
CNPJ Nº 41.522.137/0001-93
www.santanadopiaui.pi.gov.br



3.0- Aspectos Fisiográficos:

As condições climáticas do município de Santana do Piauí apresentam temperaturas mínimas de 22oC e máximas de 36oC, com clima semiúmido e quente. Ocasionalmente, chuvas intensas, com máximas em 24 horas. A precipitação pluviométrica média anual é definida no Regime Equatorial Continental, com isoietas anuais entre 800 a 1.400 mm e trimestre janeiro-fevereiro-março e dezembro-janeiro-fevereiro como os mais chuvosos. Os meses de janeiro, fevereiro e março constituem o trimestre mais úmido (IBGE, 1977). Os solos da região são provenientes da alteração de arenitos, siltitos e conglomerado. Compreendem solos litólicos, álicos e distróficos, de textura média, pouco desenvolvidos, rasos a muito rasos, fase pedregosa, com floresta caducifólia e/ou floresta sub-caducifólia/cerrado. Associados ocorrem solos podzólicos vermelho-amarelos, textura média a argilosa, fase pedregosa e não pedregosa, com misturas e transições vegetais, floresta sub-caducifólia/caatinga. Secundariamente, ocorrem areias quartzosas, que compreendem solos arenosos essencialmente quartzosos, profundos, drenados, desprovidos de minerais primários, de baixa fertilidade, com transições vegetais, fase caatinga hiperxerófila e/ou cerrado sub-caducifólio/floresta sub-caducifólia (Jacomine et al., 1986). As formas de relevo, da região em apreço, compreendem, principalmente, superfícies tabulares reelaboradas (chapadas baixas), relevo plano com partes suavemente onduladas e altitudes variando de 150 a 300 metros; superfícies tabulares cimeiras (chapadas altas), com relevo plano, altitudes entre 400 a 500 metros, com grandes mesas recortadas e superfícies onduladas com relevo movimentado, encostas e prolongamentos residuais de chapadas, desníveis e encostas mais acentuadas de vales, elevações (serras, morros e colinas), com altitudes de 150 a 500 metros (Jacomine et al., 1986).

Ronald de Matos Sousa
Ronald de Matos Sousa
Engº Civil
CREA NAC 191039745-8
CREA/PI 22589



REPÚBLICA MUNICIPAL DE Pinar del Rio
Municipio de Pinar del Rio
Calle de la Libertad, s/n
Pinar del Rio, Pinar del Rio



EM BRANCO



4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1.0 – PLACA DA OBRA:

A placa da obra deverá ser confeccionada em chapa galvanizada, montada sobre moldura de madeira, com pintura a base de poliuretano, resistente às intempéries. Será executada com dimensões de 1,80 x 3,60 metros, conforme os padrões exigidos. Terá sustentação em frechais de madeira 7,5 x 7,5 cm, na altura estabelecida pelas normas. As inscrições deverão ter todas as informações básicas sobre a obra, padrão **CODEVASF – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO**.

2.0 – TERRAPLENAGEM:

2.1 – Regularização do subleito:

Os serviços de regularização compreendem a execução de cortes e aterros de até 20,0 cm de espessura para nivelamento do terreno, sendo executado com o auxílio de equipamentos apropriados para o serviço;

Após a regularização, o subleito receberá um colchão cujo material terá expansão igual ou inferior a 2%.

2.2 – Transporte com caminhão basculante:

Este serviço contempla o bota fora do material obtido do corte, para terraplanagem da via.

O material deverá ser lançado na caçamba, de maneira que fique uniformemente distribuído no limite geométrico da mesma, para que não ocorra derramamento pelas bordas durante o transporte.

Os caminhões deverão ter as dimensões de suas caçambas medidas e anotadas, previamente visando-se facilitar a apropriação dos volumes.

A medição será feita multiplicando-se o volume carregado, em metros cúbicos.

Ronald de Matos Sousa
Ronald de Matos Sousa
Engº Civil
CREA NAC 191039745-6
CREA/PI 22588



EM BRANCO



3.0 – PAVIMENTAÇÃO:

3.1 – Colchão de Areia:

Sobre o leito de regularização da via, espalhar-se-á uma camada uniforme de areia, com espessura de 10 cm, sobre a qual se executará o piso intertravado. A areia deverá ser constituída de partículas limpas, duras e duráveis e apresentar Índice de Plasticidade nulo.

3.2 - Paralelepípedo:

Os paralelepípedos devem ser de granito, gnaisse, ou originados de outros tipos de rocha de resistência equivalente, apresentando uma distribuição uniforme dos materiais constituintes e estarem isentos de veios, falhas, materiais em desagregação ou arestas quebradas.

Devem ainda apresentar as seguintes características:

- Resistência á compressão simples: 1.000kg/cm²;
- Peso específico aparente: 2.400kg/m³;
- Absorção de água após 48 horas de imersão: 0,5%, em peso.

Os paralelepípedos devem ser aparelhados de modo que suas faces apresentem uma forma retangular. A face superior ou de uso deve apresentar uma superfície razoavelmente plana e com as arestas retilíneas.

As faces laterais não poderão apresentar convexidades ou saliências que induzam as juntas maiores que 1,5cm. O aparelhamento e a classificação por fiadas dos paralelepípedos devem ser de tal forma que no assentamento, as juntas não excedam a 1,5cm na superfície.

As dimensões dos paralelepípedos devem estar compreendidas dentro dos seguintes limites:

- Comprimento: 17 a 23cm;



EST. 1900
PROFESSOR A. S. ...
...
...



EM BRANCO





- Largura: 12 a 15cm; - Altura: 11 a 14cm.

O assentamento das rochas deverá ser feito com justaposição, de modo a não existirem juntas que comprometam a estabilidade do pavimento, após o que se procederá à compactação. O calçamento será rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

3.3 – Meio-Fio:

As valas para assentamento deverão ter profundidade tal que, o meio-fio fique enterrado no mínimo 15,0 cm. O fundo das valas onde serão assentados os meios-fios deverá ser regularizado e apiloado. O assentamento do meio-fio deverá ser executado após a regularização da via pública;


O meio-fio a ser utilizado será fabricado em concreto pré-moldado no traço 1:3:6 (cimento, areia grossa e seixo lavado ou brita). Deverá ter seção retangular com dimensões de 13,0 cm na face superior e 15,0 cm na face inferior, 30,0 cm na altura e comprimento de 1,00 m e resistência superior ou igual a 10 MPa;

Todo o rejuntamento do meio-fio pré-moldado deverá ser feito com argamassa de cimento e areia grossa isenta de argila, no traço 1:4.

3.4 – Compactação do Pavimento:

Será executada a compactação utilizando-se compactadores de placa vibratória (sapinho), de modo a se conseguir uma perfeita acomodação da brita/paralelepípedo.

A compactação deverá ser executada das bordas para o centro, paralelamente ao eixo da pista, de modo uniforme, até a completa fixação do calçamento. Qualquer irregularidade ou depressão que venha a surgir durante a compactação, deverá ser prontamente corrigida. A compactação das partes inacessíveis ao sapinho deverá ser efetuada por meio de soquetes manuais.





ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO PIAUÍ
RUA... Nº...
CEP: 64.200-000
SANTANA DO PIAUÍ - PI

EM BRANCO



OBSERVAÇÕES

- O tráfego nas vias pavimentadas somente deverá ser liberado no mínimo após quinze dias de cura do caldeamento e depois de vistoriada pela fiscalização.
- Toda areia utilizada nas argamassas deverá ter granulometria grossa e ser isenta de impurezas.
- Não serão aceitos bandas de meio-fio ao longo das vias, as referidas bandas poderão ser usadas nos contornos das esquinas.
- A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Será removido todo entulho, sendo limpos e varridos os excessos.



EM BRANCO



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO PIAUÍ
Rua Eurípedes Borges, S/N, Centro - CEP: 64.615-000
Santana do Piauí - PI
CNPJ Nº 41.522.137/0001-93
www.santanadopiaui.pi.gov.br



5. CUSTOS

O custo total do projeto será de **R\$ 251.051,64 (Duzentos e cinquenta e um mil, cinquenta e um reais e sessenta e quatro centavos)** com a pavimentação de 2.675,00 m² conforme planilha de orçamento anexa.

Ronald de Matos Sousa
Ronald de Matos Sousa
Engº Civil
CREA NAC 191039745-8
CREAPI 22589



EM BRANCO



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO PIAUÍ
Rua Eurípedes Borges, S/N, Centro - CEP: 64.615-000
Santana do Piauí - PI
CNPJ Nº 41.522.137/0001-93
www.santanadopiaui.pi.gov.br



COMISSÃO LICITACIONAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Ronald de Matos Sousa
Ronald de Matos Sousa
Engº Civil
CREA NAC 191039745-6
CREA/PI 22589



EM BRANCO



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO PIAUÍ
Rua Eurípedes Borges, S/N, Centro - CEP: 64.615-000
Santana do Piauí - PI
CNPJ Nº 41.522.137/0001-93
www.santanadopiaui.pi.gov.br

RESUMO GERAL - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPOSTA Nº 027071/2018

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍPEDO

LOCAL:SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO PIAUÍ

FONTE DE CUSTOS = SINAPI: OUT/2019 E ORSE-SE: SETEMBRO/2019 - BDI: 20,98% - LSO: 115,27% (HORA)72,94% (MÊS) - NÃO DESONERAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)
1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO PIAUÍ	UND	1,00	234.105,25	234.105,25
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (3 MESES)	UND	1,00	6.990,85	6.990,85
3	PLACA DE OBRA	M²	6,48	375,03	2.430,19
4	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO	UND	1,00	7.525,35	7.525,35
					251.051,64
Importa orçamento total de R\$ 251.051,64					
Duzentos e cinquenta e um mil, cinquenta e um reais e sessenta e quatro centavos					



Ronald de Matos Sousa
Ronald de Matos Sousa
Engº Civil
CREA NAC 191039749-8
CREA/PI 22589



EM BRANCO

1. <u>EMPREGADOR</u> 2. <u>EMPREGADO</u> 3. <u>PROFISSIONAL</u> 4. <u>OUTRO</u>	1. <u>PROFISSIONAL</u> 2. <u>OUTRO</u>	1. <u>PROFISSIONAL</u> 2. <u>OUTRO</u>	1. <u>PROFISSIONAL</u> 2. <u>OUTRO</u>
--	---	---	---

LOJAS DE CRIELOS - 2014/01/01 - 2014/01/31 - 2014/01/31 - 2014/01/31 - 2014/01/31
 PROFISSIONAL - 2014/01/01 - 2014/01/31 - 2014/01/31 - 2014/01/31 - 2014/01/31
 OUTRO - 2014/01/01 - 2014/01/31 - 2014/01/31 - 2014/01/31 - 2014/01/31

2014/01/01
 2014/01/31



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO PIAUÍ
Rua Eurípedes Borges, S/N, Centro - CEP: 64.615-000
Santana do Piauí - PI
CNPJ Nº 41.522.137/0001-93
www.santanadopiaui.pi.gov.br

RESUMO DAS VIAS

PROPOSTA Nº 027071/2018

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍPEDO

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO PIAUÍ

FONTE DE CUSTOS = SINAPI: OUT/2019 E ORSE-SE: SETEMBRO/2019 - BDI: 20,98% - LSO: 115,27% (HORA)72,94% (MÊS) - NÃO DESONERAÇÃO

PLANILHA RESUMO DAS VIAS					
Item	Discriminação	Extensão (m)	Largura (m)	Área (m ²)	Valor (R\$)
1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO PIAUÍ				
1.1	RUA SÃO PEDRO	535,00	5,00	2.675,00	234.105,25
	TOTAL	535,00		2.675,00	



Ronald de Matos Sousa
Ronald de Matos Sousa
Eng^o Civil
CREA NAC 191039745-8
CREA/PI 22589



ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO PIAUÍ
 Rua Eurípedes Borges, S/N. Centro - CEP: 64.615-000
 Santana do Piauí - PI
 CNPJ Nº 41.522.137/0001-93
 www.santanadopiaui.pi.gov.br


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RUA PROJETADA/ SÃO PEDRO

PROPOSTA Nº 027071/2018

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍEDO

FONTE DE CUSTOS = SINAPI: OUT/2019 E ORSE-SE: SETEMBRO/2019 - BDI: 20,98% - LSO: 115,27% (HORA)72,94% (MÊS) - NÃO DESONERAÇÃO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO PIAUÍ						
Item	Código	Descrição	Und	Qty	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)
1.0	RUA SÃO PEDRO					R\$ 234.105,25
1.1	Terraplenagem					R\$ 1.364,25
1.1.1	79472	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	2.675,00	0,51	R\$ 1.364,25
1.2	Pavimentação					R\$ 180.781,91
1.2.1	ORSE 9104 (ADAPTADO)	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO GRANÍTICO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3.	M2	2.675,00	53,26	R\$ 142.470,50
1.2.2	COMP. 01	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR	M2	2.675,00	1,49	R\$ 3.985,75
1.2.3	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. (ADAPTADO)	M	1.051,00	32,66	R\$ 34.325,66
1.3	Drenagem					R\$ 40.532,40
1.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.051,00	37,53	R\$ 39.444,03
1.4	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016. MEIO-FIO DE CONTENÇÃO	M	29,00	37,53	R\$ 1.088,37
1.4	Sinalização e identificação					R\$ 1.153,41
1.4.1	COMP. 02	Placa de identificação das ruas c/ tubo de ferro galvanizado	UN	3,00	384,47	R\$ 1.153,41
1.5	Transporte					R\$ 10.273,28
1.5.1	72840	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	14.981,87	0,64	R\$ 9.588,40
1.5.2	72838	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NATURAL	TXKM	713,42	0,96	R\$ 684,88
					Total (R\$)	234.105,25



Eng.º Civil de Matos Sousa
 ENO 0141
 CREA/PIAC 18132/2014
 CREA/PI 22588



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO PIAUÍ
Rua Eurípedes Borges, S/N, Centro - CEP: 64.615-000
Santana do Piauí - PI
CNPJ Nº 41.522.137/0001-93
www.santanadopiaui.pi.gov.br



MEMORIA DE CÁLCULO

Ronald de Matos Sousa
Ronald de Matos Sousa
Eng.º Civil
CREA NAC 191039745-0
CREAMP1 22589



Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.



EM BRANCO





ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO PIAUÍ
 Rua Eurípedes Borges, S/N. Centro - CEP: 64.615-000
 Santana do Piauí - PI
 CNPJ Nº 41.522.137/0001-93
 www.santanadopiaui.pi.gov.br

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PROPOSTA Nº 027071/2018

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍEDO

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO PIAUÍ

FONTE DE CUSTOS = SINAPI: OUT/2019 E ORSE-SE: SETEMBRO/2019 - BDI: 20,98% - LSO: 115,27% (HORA)72,94% (MÊS) - NÃO DESONERAÇÃO

MEMORIAL DE CÁLCULO				
Item	Código	Descrição	Und	Qty
1 RUA SÃO PEDRO				
1.1 Terraplenagem				
1.1.1	79472	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	535 * 5
1.2 Pavimentação				
1.2.1	ORSE 9104 (ADAPTADO)	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO GRANÍTICO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3.	M2	535 * 5
1.2.2	COMP. 01	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR	M2	535 * 5
1.2.3	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. (ADAPTADO)	M	535 * 2,00-5,00-7,00*2,00
1.3 Drenagem				
1.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	535 * 2,00-5,00-7,00*2,00
1.3.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016. MEIO-FIO DE CONTENÇÃO	M	5 * 3,00+7,00*2
1.4 Sinalização e identificação				
1.4.1	COMP. 02	Placa de identificação das ruas c/ tubo de ferro galvanizado	UN	3,00
1.5 Transporte				
1.5.1	72840	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	5,6007 * 535 * 5
1.5.2	72838	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NATURAL	TXKM	0,2667*535*5



Ronald de Matos Sousa
 Eng.º CIVIL
 CREA NAC 151039745-8
 CREA/PI 22589



Form with a grid of boxes, possibly for a checklist or data entry. The boxes are mostly empty.

EM BRANCO

Handwritten text, possibly a signature or address, located in the right margin of the form area.

Handwritten text at the bottom right of the page, possibly a date or reference number.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO PIAUI
Rua Eurípedes Borges, S/N, Centro - CEP: 64.615-000
Santana do Piauí - PI
CNPJ Nº 41.522.137/0001-93
www.santanadopiaui.pi.gov.br



COMISSÃO LICITATÓRIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Ronald de Matos Sousa
Ronald de Matos Sousa
Engº Civil
CREA NAC 191039745-6
CREAPI 22589



EM BRANCO



ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO PIAUÍ
 Rua Eurípedes Borges, S/N, Centro - CEP: 64.615-000
 Santana do Piauí - PI
 CNPJ Nº 41.522.137/0001-93
 www.santanadopiaui.pi.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO


PROPOSTA Nº 027071/2018

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍPEDO

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO PIAUÍ

FONTE DE CUSTOS = SINAPI: OUT/2019 E ORSE-SE: SETEMBRO/2019 - BDI: 20,98% - LSO: 115,27% (HORA) 72,94% (MÊS) - NÃO DESONERAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO (%)	VALOR DAS OBRAS E SERVIÇOS (R\$)	MESES			
			1	2	3	
			%	%	%	
1.0	ELABORAÇÃO DE PROJETO	3,00%	7.525,35	7.525,35	-	-
			100,00%			
2.0	PLACA DE OBRA	0,97%	2.430,19	2.430,19	-	-
			100,00%			
3.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	2,78%	6.990,85	2.330,28	2.330,28	2.330,28
			33,33%	33,33%	33,33%	
4.0	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO PIAUÍ		234.105,25			
4.1	RUA SÃO PEDRO		234.105,25			
4.1.1	Terraplenagem	0,54%	1364,25	222,24	574,35	567,66
				16,29%	42,10%	41,61%
4.1.2	Pavimentação	72,01%	180.781,91	29.449,37	76.109,18	75.223,35
				16,29%	42,10%	41,61%
4.1.3	Drenagem	16,15%	40.532,40	6.602,73	17.064,14	16.865,53
				16,29%	42,10%	41,61%
4.1.4	Sinalização e identificação	0,46%	1.153,41	-	-	1.153,41
						100,00%
4.1.5	Transporte	4,09%	10.273,28	1.660,00	4.345,00	4.274,71
				16,29%	42,10%	41,61%
	TOTAL	100,00%	251.051,64			
			PORCENTAGEM	20,00%	40,00%	40,00%
			PORCENTAGEM ACUMULADO	20,00%	60,00%	100,00%
			VALOR TOTAL (R\$)	50.210,32	100.420,66	100.420,66
			VALOR TOTAL ACUMULADO (R\$)	50.210,32	150.630,74	251.051,64



Ronald de Matos Sousa
 Engº CIVIL
 CREA/AC 191030746-0
 CREA/PI 22589



EM BRANCO

[Faint handwritten text or signature]



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO PIAUÍ
Rua Eurípedes Borges, S/N, Centro - CEP: 64.615-000
Santana do Piauí - PI
CNPJ Nº 41.522.137/0001-93
www.santanadopiaui.pi.gov.br



BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS

Ronald de Matos Sousa
Ronald de Matos Sousa
Engº Civil
CREA NAC 191039745-E
CREMPI 22589



UNIVERSIDADE DE COIMBRA
FACULDADE DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA
ANEXO I - Regulamento do Curso

10/01/2014

EM BRANCO



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO PIAUÍ
Rua Eurípedes Borges, S/N, Centro - CEP: 64.615-000
Santana do Piauí - PI
CNPJ Nº 41.522.137/0001-93
www.santanadopiaui.pi.gov.br



COMPOSIÇÃO DO BDI

PROPOSTA Nº 027071/2018

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍEDO

LOCAL:SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO PIAUÍ

FONTE DE CUSTOS = SINAPI: OUT/2019 E ORSE-SE: SETEMBRO/2019 - BDI: 20,98% - LSO: 115,27%
(HORA)72,94% (MÊS) - NÃO DESONERAÇÃO


ITEM	ITEM COMPONENTE DO BDI	BDI
1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,80%
2	SEGURO E GARANTIA (S + G)	0,38%
3	RISCO (R)	0,50%
4	DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	1,02%
5	LUCRO (L)	6,80%
6	TRIBUTOS - PIS, COFINS e ISSQN (I)	6,65%
6.1	COFINS	3,00%
6.2	PIS	0,65%
6.3	ISS	3,00%
6.4	CPRB	0,00%
TOTAL = { [(1 + AC + S + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)] / (1 - I) } - 1		20,98%

OBS : ISS 3% ADOTADO PELA PREFEITURA DE SANTANA DO PIAUÍ

Ronald de Matos Sousa
Ronald de Matos Sousa
Engº Civil
CREA NAC 191039745-8
CREA/PI 22589



Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal de Santa Maria
 Comissão do BDI



PROPOSTA Nº 02/2010
 OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O PROJETO DE REFORMA DO PAVILÃO DE ESPORTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS.
 LOCAL: PAVILÃO DE ESPORTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS.
 VALOR ESTIMADO: R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais).

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2	SEGURO FIANÇA			
3	RISCO (R)			
4	DESEMBOLSAMENTO			
5	LUCRO (L)			
6	RESERVA TÉCNICA			
7	RESERVA FINANCEIRA			
8	RESERVA DE RISCO			
9	RESERVA DE LUCRO			
10	RESERVA DE RISCO			
11	RESERVA DE LUCRO			
12	RESERVA DE RISCO			
13	RESERVA DE LUCRO			
14	RESERVA DE RISCO			
15	RESERVA DE LUCRO			
16	RESERVA DE RISCO			
17	RESERVA DE LUCRO			
18	RESERVA DE RISCO			
19	RESERVA DE LUCRO			
20	RESERVA DE RISCO			
21	RESERVA DE LUCRO			
22	RESERVA DE RISCO			
23	RESERVA DE LUCRO			
24	RESERVA DE RISCO			
25	RESERVA DE LUCRO			
26	RESERVA DE RISCO			
27	RESERVA DE LUCRO			
28	RESERVA DE RISCO			
29	RESERVA DE LUCRO			
30	RESERVA DE RISCO			
31	RESERVA DE LUCRO			
32	RESERVA DE RISCO			
33	RESERVA DE LUCRO			
34	RESERVA DE RISCO			
35	RESERVA DE LUCRO			
36	RESERVA DE RISCO			
37	RESERVA DE LUCRO			
38	RESERVA DE RISCO			
39	RESERVA DE LUCRO			
40	RESERVA DE RISCO			
41	RESERVA DE LUCRO			
42	RESERVA DE RISCO			
43	RESERVA DE LUCRO			
44	RESERVA DE RISCO			
45	RESERVA DE LUCRO			
46	RESERVA DE RISCO			
47	RESERVA DE LUCRO			
48	RESERVA DE RISCO			
49	RESERVA DE LUCRO			
50	RESERVA DE RISCO			
51	RESERVA DE LUCRO			
52	RESERVA DE RISCO			
53	RESERVA DE LUCRO			
54	RESERVA DE RISCO			
55	RESERVA DE LUCRO			
56	RESERVA DE RISCO			
57	RESERVA DE LUCRO			
58	RESERVA DE RISCO			
59	RESERVA DE LUCRO			
60	RESERVA DE RISCO			
61	RESERVA DE LUCRO			
62	RESERVA DE RISCO			
63	RESERVA DE LUCRO			
64	RESERVA DE RISCO			
65	RESERVA DE LUCRO			
66	RESERVA DE RISCO			
67	RESERVA DE LUCRO			
68	RESERVA DE RISCO			
69	RESERVA DE LUCRO			
70	RESERVA DE RISCO			
71	RESERVA DE LUCRO			
72	RESERVA DE RISCO			
73	RESERVA DE LUCRO			
74	RESERVA DE RISCO			
75	RESERVA DE LUCRO			
76	RESERVA DE RISCO			
77	RESERVA DE LUCRO			
78	RESERVA DE RISCO			
79	RESERVA DE LUCRO			
80	RESERVA DE RISCO			
81	RESERVA DE LUCRO			
82	RESERVA DE RISCO			
83	RESERVA DE LUCRO			
84	RESERVA DE RISCO			
85	RESERVA DE LUCRO			
86	RESERVA DE RISCO			
87	RESERVA DE LUCRO			
88	RESERVA DE RISCO			
89	RESERVA DE LUCRO			
90	RESERVA DE RISCO			
91	RESERVA DE LUCRO			
92	RESERVA DE RISCO			
93	RESERVA DE LUCRO			
94	RESERVA DE RISCO			
95	RESERVA DE LUCRO			
96	RESERVA DE RISCO			
97	RESERVA DE LUCRO			
98	RESERVA DE RISCO			
99	RESERVA DE LUCRO			
100	RESERVA DE RISCO			
TOTAL				

EM BRANCO



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO PIAUÍ
Rua Eurípedes Borges, S/N, Centro - CEP: 64.615-000
Santana do Piauí - PI
CNPJ Nº 41.522.137/0001-93
www.santanadopiaui.pi.gov.br



COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

Ronald de Matos Sousa
Ronald de Matos Sousa
Engº Civil
CREA NAC 191039745-0
CREAPI 22589

MAPA DE CONTABILIDADE

RESUMO DA SÍNTESE DE CONTABILIDADE
EXERCÍCIO DE 2014



EM BRANCO



ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO PIAUÍ
 Rua Eurípedes Borges, S/N, Centro - CEP: 64.615-000
 Santana do Piauí - PI
 CNPJ Nº 41.522.137/0001-93
 www.santanadopiaui.pi.gov.br
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍEDO

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO PIAUÍ

FONTE DE CUSTOS = SINAPI: OUT/2019 E ORSE-SE: SETEMBRO/2019 - BDI: 20,98% - LSO: 115,27% (HORA)72,94% (MÊS) - NÃO DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO						
Administração local da obra (3 meses)			Fonte		Código	UNIDADE:
			S/ REF.		S/C	UND
Mão-de-obra	Quant.	Unid.	Referência		Salário hora	Custo horário
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	29,3911	H	SINAPI	90777	85,37	2.509,12
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	60,0000	H	SINAPI	90776	23,81	1.428,60
APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	120,0000	H	SINAPI	90767	15,34	1.840,80
Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]						5.778,52
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3]						5.778,52
B.D.I. = 20,98% [4]						1212,33
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5]						6.990,85

Ronald de Matos Souza
 Ronald de Matos Souza
 Engº Civil
 CREA NAC 1910397-5
 CREA/PI 22589



ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO PIAUÍ
 Rua Eurípedes Borges, S/N, Centro - CEP: 64.615-000
 Santana do Piauí - PI
 CNPJ Nº 41.522.137/0001-93
 www.santanadopiaui.pi.gov.br

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

PROPOSTA Nº 027071/2018

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍPEDO

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO PIAUÍ

FONTE DE CUSTOS = SINAPI: OUT/2019 E ORSE-SE: SETEMBRO/2019 - BDI: 20,98% - LSO: 115,27% (HORA)72,94% (MÊS) - NÃO DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÃO					
Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)
74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2			375,03
4417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,0000	3,36	3,36
4491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	4,0000	4,00	16,00
4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	1,0000	240,00	240,00
5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,1100	9,94	1,09
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	18,46	18,46
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	14,38	28,76
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,0100	232,07	2,32
CUSTO DIRETO TOTAL (R\$):					309,99
BDI (20,98%)					65,04
TOTAL DA COMPOSIÇÃO					375,03

Ronald de Matos Souza
 Ronald de Matos Souza
 Engº Civil
 CREA NAC 19103974-8
 CREA/PI 22589



ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO PIAUÍ
 Rua Eurípedes Borges, S/N, Centro - CEP: 64.615-000
 Santana do Piauí - PI
 CNPJ Nº 41.522.137/0001-93
 www.santanadopiaui.pi.gov.br

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

PROPOSTA Nº 027071/2018

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍPEDO

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO PIAUÍ

FONTE DE CUSTOS = SINAPI: OUT/2019 E ORSE-SE: SETEMBRO/2019 - BDI: 20,98% - LSO: 115,27% (HORA)72,94% (MÊS) - NÃO DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÃO					
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)
79472	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2			0,51
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0030	142,30	0,42
CUSTO DIRETO TOTAL (R\$):					0,42
BDI (20,98%)					0,09
TOTAL DA COMPOSIÇÃO					0,51
ORSE 9104 (ADAPTADO)	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3.	M2			53,26
366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,1300	20,50	2,66
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0250	425,78	10,64
COTAÇÃO	PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO	MIL	0,0420	350,00	14,70
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000	18,50	7,40
88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000	14,38	8,62
CUSTO DIRETO TOTAL (R\$):					44,02
BDI (20,98%)					9,24
TOTAL DA COMPOSIÇÃO					53,26



Ronald de Matos Souza
 Ronald de Matos Souza
 Engº Civil
 CREA NAC 191039745-8
 CREA/PI 22589



EM BRANCO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE QUÍMICA
LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO PIAUÍ
Rua Eurípedes Borges, S/N, Centro - CEP: 64.615-000
Santana do Piauí - PI
CNPJ Nº 41.522.137/0001-93
www.santanadopiaui.pi.gov.br

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

PROPOSTA Nº 027071/2018

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍPEDO

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO PIAUÍ

FONTE DE CUSTOS = SINAPI: OUT/2019 E ORSE-SE: SETEMBRO/2019 - BDI: 20,98% - LSO: 115,27% (HORA)72,94% (MÊS) - NÃO DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÃO					
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)
COMP. 01	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR	M2			1,49
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0800	14,38	1,15
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0110	7,71	0,08
CUSTO DIRETO TOTAL (R\$):					1,23
BDI (20,98%)					0,26
TOTAL DA COMPOSIÇÃO					1,49



Ronald de Matos Sousa
Engº Civil
CREA NAC 191039745-8
CREA/PI 22589



EM BRANCO

AV. ...

LOCAL ...

OPERÁRIO ...

Associação de Pais e Professores



Associação de Pais e Professores



ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO PIAUÍ
 Rua Eurípedes Borges, S/N, Centro - CEP: 64.615-000
 Santana do Piauí - PI
 CNPJ Nº 41.522.137/0001-93
 www.santanadopiaui.pi.gov.br

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

PROPOSTA Nº 027071/2018

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍPEDO

LOCAL:SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO PIAUÍ

FONTE DE CUSTOS = SINAPI: OUT/2019 E ORSE-SE: SETEMBRO/2019 - BDI: 20,98% - LSO: 115,27% (HORA)72,94% (MÊS) - NÃO DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÃO					
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)
94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. (ADAPTADO)	M			32,66
4517	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,2000	1,44	0,28
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0100	30,00	0,30
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,0370	288,57	10,67
6189	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,0830	9,75	0,80
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4540	14,38	6,52
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4540	18,59	8,43
CUSTO DIRETO TOTAL (R\$):					27,00
BDI (20,98%)					5,66
TOTAL DA COMPOSIÇÃO					32,66

Ronald de Matos Sousa
 Ronald de Matos Sousa
 Engº Civil
 CREA NAC 151039745-8
 CREA/PI 22589



ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO PIAUÍ
 Rua Eurípedes Borges, S/N, Centro - CEP: 64.615-000
 Santana do Piauí - PI
 CNPJ Nº 41.522.137/0001-93
 www.santanadopiaui.pi.gov.br

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

PROPOSTA Nº 027071/2018

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍPEDO

LOCAL:SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO PIAUÍ

FONTE DE CUSTOS = SINAPI: OUT/2019 E ORSE-SE: SETEMBRO/2019 - BDI: 20,98% - LSO: 115,27% (HORA)72,94% (MÊS) - NÃO DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÃO					
Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)
94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M			37,53
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0070	30,00	0,21
4059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2)	M	1,0050	16,90	16,98
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0020	425,78	0,85
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3940	18,59	7,32
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3940	14,38	5,66
CUSTO DIRETO TOTAL (R\$):					31,02
BDI (20,98%)					6,51
TOTAL DA COMPOSIÇÃO					37,53

Ronald de Matos Sousa
 Engº Civil
 CREA NAC 191039745-8
 CREA/PI 22588

EM BRANCO

CONDOMÍNIO DE BORGES (RJ)

INSTRUMENTO



REO



ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO PIAUÍ
 Rua Eurípedes Borges, S/N, Centro - CEP: 64.615-000
 Santana do Piauí - PI
 CNPJ Nº 41.522.137/0001-93
 www.santanadopiaui.pi.gov.br

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

PROPOSTA Nº 027071/2018

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍPEDO

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO PIAUÍ

FONTE DE CUSTOS = SINAPI: OUT/2019 E ORSE-SE: SETEMBRO/2019 - BDI: 20,98% - LSO: 115,27% (HORA)72,94% (MÊS) - NÃO DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÃO					
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)
COMP. 02	Placa de identificação das ruas c/ tubo de ferro galvanizado	UN			384,47
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500	18,59	4,64
88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500	14,38	3,59
73916/2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,0000	85,43	170,86
7696	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	M	2,7000	42,52	114,80
1318	CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM (16,0 KG/M2)	KG	3,6000	4,50	16,20
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	0,0200	56,88	1,13
73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO	M3	0,0200	329,48	6,58
CUSTO DIRETO TOTAL (R\$):					317,80
BDI (20,98%)					66,67
TOTAL DA COMPOSIÇÃO					384,47

Ronald de Matos Sousa
 Ronald de Matos Sousa
 Engº Civil
 CREA NAC 191039/45
 CREA/PI 2258



ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO PIAUÍ
 Rua Eurípedes Borges, S/N, Centro - CEP: 64.615-000
 Santana do Piauí - PI
 CNPJ Nº 41.522.137/0001-93
 www.santanadopiaui.pi.gov.br

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

PROPOSTA Nº 027071/2018

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍPEDO

LOCAL:SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO PIAUÍ

FONTE DE CUSTOS = SINAPI: OUT/2019 E ORSE-SE: SETEMBRO/2019 - BDI: 20,98% - LSO: 115,27% (HORA)72,94% (MÊS) - NÃO DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÃO					
Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)
72840	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM			0,64
5824	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0045	118,92	0,53
CUSTO DIRETO TOTAL (R\$):					0,53
BDI (20,98%)					0,11
TOTAL DA COMPOSIÇÃO					0,64
72838	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NATURAL	TXKM			0,96
5824	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0067	118,92	0,79
CUSTO DIRETO TOTAL (R\$):					0,79
BDI (20,98%)					0,17
TOTAL DA COMPOSIÇÃO					0,96

Ronald de Matos Souza
 Ronald de Matos Souza
 Engº Civil
 CREA NAC 191039745
 CREA/PI 22589




Handwritten scribbles at the top left of the page.

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
21.0
22.0
23.0
24.0
25.0
26.0
27.0
28.0
29.0
30.0
31.0
32.0
33.0
34.0
35.0
36.0
37.0
38.0
39.0
40.0
41.0
42.0
43.0
44.0
45.0
46.0
47.0
48.0
49.0
50.0
51.0
52.0
53.0
54.0
55.0
56.0
57.0
58.0
59.0
60.0
61.0
62.0
63.0
64.0
65.0
66.0
67.0
68.0
69.0
70.0
71.0
72.0
73.0
74.0
75.0
76.0
77.0
78.0
79.0
80.0
81.0
82.0
83.0
84.0
85.0
86.0
87.0
88.0
89.0
90.0
91.0
92.0
93.0
94.0
95.0
96.0
97.0
98.0
99.0
100.0

EM BRANCO

Handwritten text at the bottom left, possibly a date or reference number.



Vertical text on the right side of the page, possibly a page number or document identifier.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PROPOSTA Nº 027071/2018

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍPEDO

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO PIAUÍ

FUNTE DE CUSTOS = SINAPI: OUT/2019 E ORSE-SE: SETEMBRO/2019 - BDI: 20,98% - LSO: 115,27% (HORA)72,94% (MÊS) - NÃO DESONERAÇÃO

Cálculo do Frete de Paralelepípedo - Transporte Comercial (SINAPI)

1 - Dimensões do Paralelepípedo

Largura: 12,00 cm
Altura: 12,00 cm
Comprimento: 14,00 cm
Junta: 2,50 cm

2 - Massa Especifica do Material (Arenito)

M: 2.100,00 kg/m³

3 - Cálculos

Massa de um paralelepípedo: 4,2336 Kg Volume do Parale x M

Massa do milheiro paralelepípedo: 4.233,600 Kg Massa de um Parale x 1000

Taxa de pedra por m²: 42,00 und/m²

Massa de pedras/m²: 0,1778 ton/m² (Massa de um Parale x Taxa) / 1000

4 - TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA (SINAPI 72840)

Distância de Transporte: 31,50 km

Total do Item / m²: 5,60070 (T x Km) / m²

massa pedra x Distan

5 - TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NATURAL (SINAPI 72838)

Distância de Transporte: 1,50 km

Total do Item / m²: 0,26670 (T x Km) / m²

massa pedra x Distan

Ronald de Matos Sousa
Ronald de Matos Sousa
Eng^o Civil
CREA NAC 191039745-8
CREAPI 22589

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PROPOSTA Nº 027071/2018

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍEDO

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO PIAUÍ

FONTE DE CUSTOS = SINAPI: OUT/2019 E ORSE-SE: SETEMBRO/2019 - BDI: 20,98% - LSO: 115,27% (HORA) 72,94% (MÊS) - NÃO DESONERAÇÃO

COMPARATIVO

Cálculos

Massa de um paralelepípedo: 4,2336 Kg Volume do Parale x M

Massa do milheiro paralelepípedo: 4.233,600 Kg Massa de um Parale x 1000

Taxa de pedra por m²: 42,00 und/m²

Massa de pedras/m²: 0,1778 ton/m² (Massa de um Parale x Taxa) / 1000

Área da pavimentação 2.675,00 m²

COTAÇÃO 01

Preço do milheiro de pedra de paralelepípedo R\$ 320,00
Transporte em rodovia pavimentada 83,00 km
Transporte em rodovia vicinal 2,00 km

Código	Descrição	Und	Qtd	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)
72840	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	39.476,05	0,64	R\$ 25.264,67
72838	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NATURAL	TXKM	951,23	0,96	R\$ 913,18
COTAÇÃO	PARALELEPÍEDO GRANÍTICO	MIL	112,35	320,00	R\$ 35.952,00
				Total	R\$ 62.129,85

COTAÇÃO 02

Preço do milheiro de pedra de paralelepípedo R\$ 350,00
Transporte em rodovia pavimentada 31,50 km
Transporte em rodovia vicinal 1,50 km

Código	Descrição	Und	Qtd	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)
72840	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	14.981,87	0,64	R\$ 9.588,40
72838	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NATURAL	TXKM	713,42	0,96	R\$ 684,88
COTAÇÃO	PARALELEPÍEDO GRANÍTICO	MIL	112,35	350,00	R\$ 39.322,50
				Total	R\$ 49.595,78

COTAÇÃO 03

Preço do milheiro de pedra de paralelepípedo R\$ 360,00
Transporte em rodovia pavimentada 43,00 km
Transporte em rodovia vicinal 1,00 km

Código	Descrição	Und	Qtd	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)
72840	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	20.451,45	0,64	R\$ 13.088,93
72838	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NATURAL	TXKM	475,62	0,96	R\$ 456,60
COTAÇÃO	PARALELEPÍEDO GRANÍTICO	MIL	112,35	360,00	R\$ 40.446,00

RESUMO

COTAÇÃO 01	R\$	62.129,85
COTAÇÃO 02	R\$	49.595,78
COTAÇÃO 03	R\$	53.991,53

Ronald de Matos Sousa
Ronald de Matos Sousa
Engº Civil
CREA NAC 191039745-E
CREA/PI 22589



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO PIAUÍ
Rua Eurípedes Borges, S/N, Centro - CEP: 64.615-000
Santana do Piauí - PI
CNPJ Nº 41.522.137/0001-93
www.santanadopiaui.pi.gov.br



LEIS SOCIAIS

Ronald de Matos Sousa
Ronald de Matos Sousa
Engº Civil
CREA NAC 191039745-0
CREA/PI 22589



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



EM BRANCO



ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO PIAUÍ
 Rua Eurípedes Borges, S/N, Centro - CEP: 64.615-000
 Santana do Piauí - PI
 CNPJ Nº 41.522.137/0001-93
 www.santanadopiaui.pi.gov.br



ENCARGOS SOCIAIS

PROPOSTA Nº 027071/2018

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍPEDO

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO PIAUÍ

FONTE DE CUSTOS = SINAPI: OUT/2019 E ORSE-SE: SETEMBRO/2019 - BDI: 20,98% - LSO: 115,27% (HORA) 72,94% (MÊS) - NÃO DESONERAÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO-DE-OBRA NÃO DESONERAÇÃO			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
GRUPO A			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES NO TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	36,80%	36,80%
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,83%	Não incide
B2	FERIADOS	3,95%	Não incide
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,93%	0,71%
B4	13º SALÁRIO	10,85%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,17%	Não incide
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,09%
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,76%	7,49%
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03%	0,02%
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A	45,42%	17,26%
GRUPO C			
C1	AVISO PREVIO IDENIZADO	6,10%	4,68%
C2	AVISO PREVIO TRABALHO	0,14%	0,11%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,11%	3,15%
C4	DEPOSITO RECISAO SEM JUSTA CAUSA	4,94%	3,79%
C5	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,51%	0,39%
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A	15,80%	12,12%
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	16,71%	6,35%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO DE TRABALHO E REINCIDENCIAS DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO	0,54%	0,41%
D	TOTAL DAS TAXAS DE INCIDÊNCIAS E REINCIDÊNCIAS	17,25%	6,76%
TOTAL DOS ENCARGOS (A+B+C+D)		115,27%	72,94%

FONTE: SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNCIDES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Ronald de Matos Sousa
 Engº Civil
 CREA NAC 191039745-8
 CREA/PI 22589



EM BRANCO



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO PIAUÍ
Rua Eurípedes Borges, S/N, Centro - CEP: 64.615-000
Santana do Piauí - PI
CNPJ Nº 41.522.137/0001-93
www.santanadopiaui.pi.gov.br





6. PLANTAS TÉCNICAS

Ronald de Matos Sousa
Ronald de Matos Sousa
Engº Civil
CREA NAC 191039745-6
CREAPI 22589

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE ECONOMIA
ESTATÍSTICA
E SOCIOLOGIA



EM BRANCO

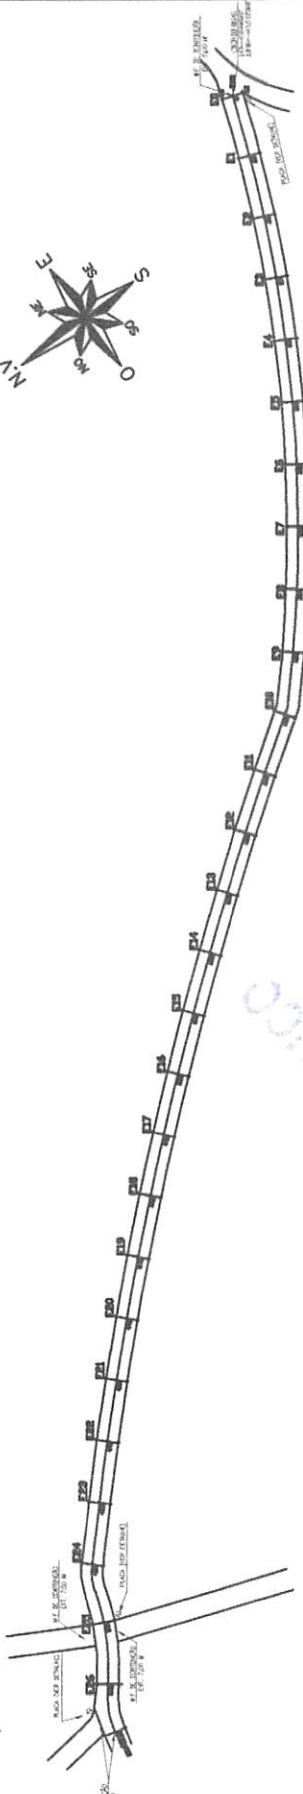


RUA SÃO PEDRO


EM BRANCO

SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÉDRO		ÁREA: 2.675,00m ²
		COMPRIMENTO: 535,00m
DESENHO: TRECHO LOGRADOURO, DETALHES E PERFIL LONGITUDINAL DA PAVIMENTAÇÃO		LARGURA: 5,00m
LOCAL DA OBRA: RUA SÃO PEDRO BPO. CENTRO	RESP. TÉCNICO:	
MUNICÍPIO: SANTANA DO PIAUI	ESTADO: PIAUI	FRANCHA: 1/3
ESCALA: 1/1500	DATA: MARÇO/2019	DESENHO: A3





12/11/1994

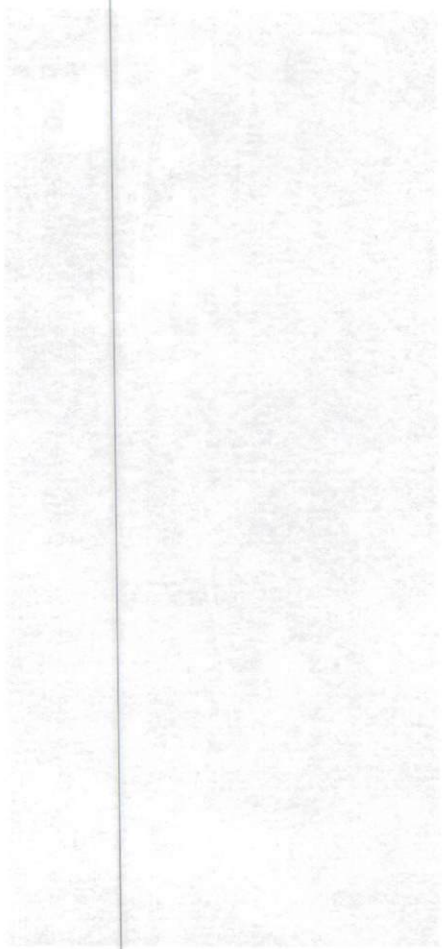

EM BRANCO



12/11/1994





Santana do Piauí

Rua São Pedro

Legenda

Google Earth

Image © 2011, DigitalGlobe
© 2011, Google

200 m



EM BRANCO

10/10/2018

10/10/2018

FIG. 01 - TERRENO NATURAL



FIG. 02 - REGULIZAÇÃO GREIDE



FIG. 03 - IMPLANTAÇÃO MEIO FIO E COLCHÃO DE AREIA







Fig. 04c PAVIMENTAÇÃO SEÇÃO TIPO

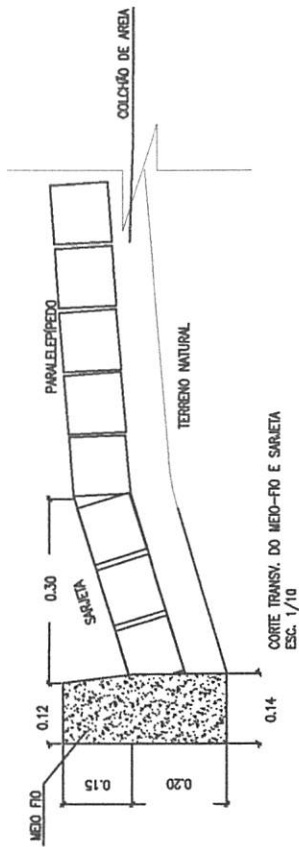

CORTE TRANSV. DO MEIO-FIO E SARRETA
ESC. 1/10

VISTA SUPERIOR DA PLACA
S/ESC.

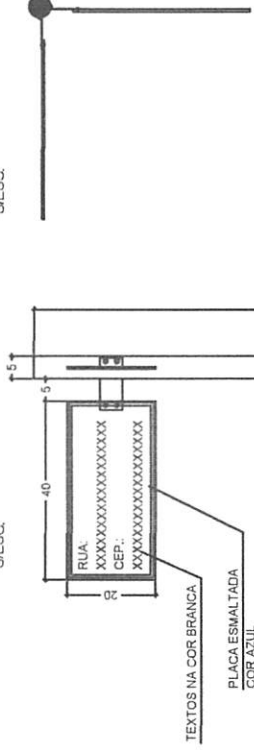

CALÇADA

FUNDAÇÃO EM
CONCRETO SIMPLES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO PIAUÍ

SERVIÇO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO		
DESENHO:	TRECHO LOGRADOURA, DETALHES E PERFIL LONGITUDINAL DA PAVIMENTAÇÃO		
LOCAL DA OBRA:	RUA SÃO PEDRO	BRO. CENTRO	RESP. TÉCNICO
MUNICÍPIO:	SANTANA DO PIAUÍ	ESTADO: PIAUÍ	FRANCHA: 2/3
ESCALA:	INDICADA	DATA: MARÇO/2019	DESENHO: A4


ÁREA: 2,675,00m²
COMPRIMENTO: 535,00m
LARGURA: 5,00m






EM BRANCO



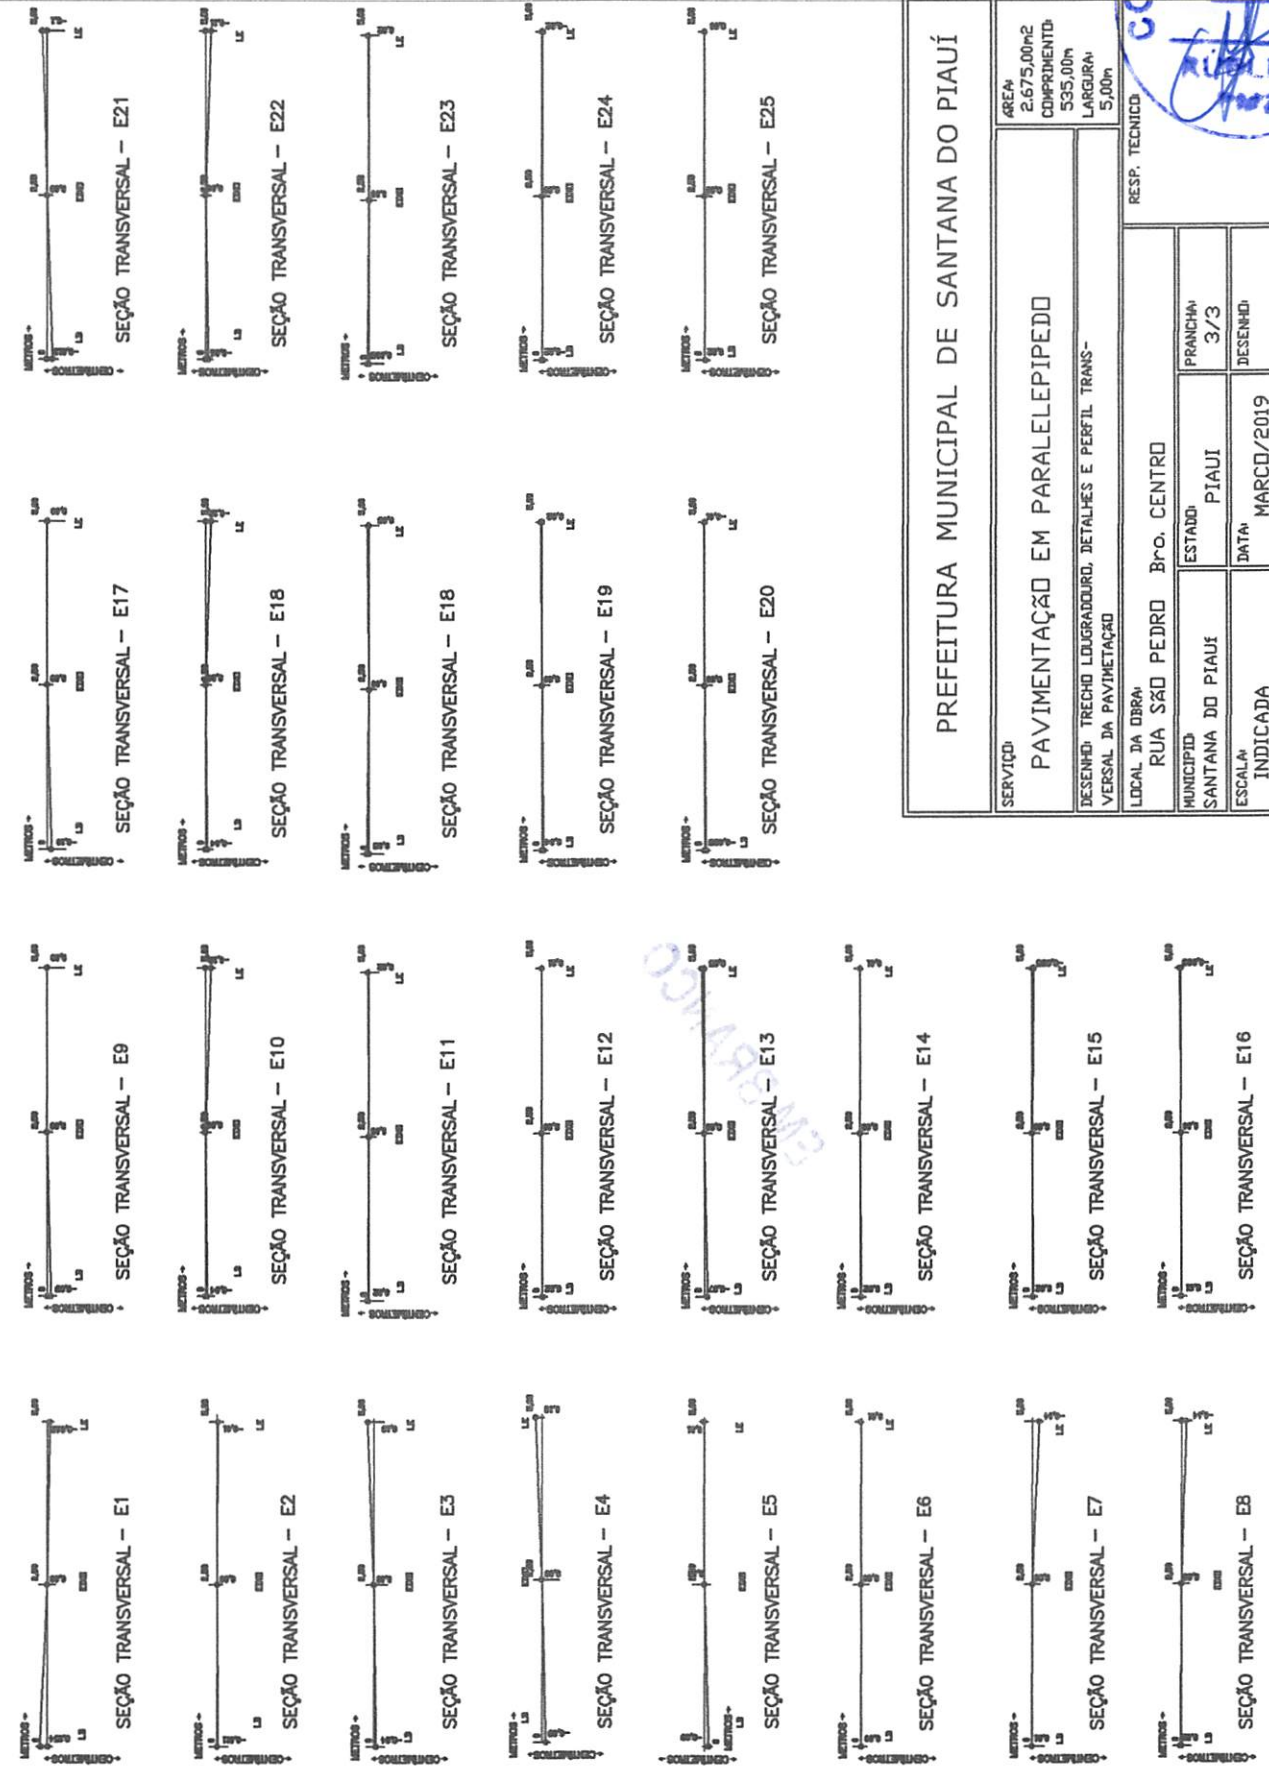

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO PIAUÍ

SERVIÇO:		ÁREA: 2,675,00m ²	RESP. TÉCNICO:
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO		COMPRIMENTO: 535,00m	
DESENHO: TRECHO LOGRADOURA, DETALHES E PERFIL TRANSVERSAL DA PAVIMENTAÇÃO		LARGURA: 5,00m	
LOCAL DA OBRA: RUA SÃO PEDRO BPO. CENTRO		MUNICÍPIO: SANTANA DO PIAUÍ	PRANCHETA: 3/3
INDICADA		ESTADO: PIAUI	DESENHO:
		DATA: MARÇO/2019	



EM BRANCO



7. LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

SANTANA DO PIAUÍ - PI





ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE SANTANA DO PIAUÍ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RUA ... Nº ...
SANTANA DO PIAUÍ - PI
CEP: ...




EM BRANCO



8. ANEXOS



Ronald de Matos Sousa
Ronald de Matos Sousa
Engº Civil
CREANAC 191039745-8
CREAPI 22589

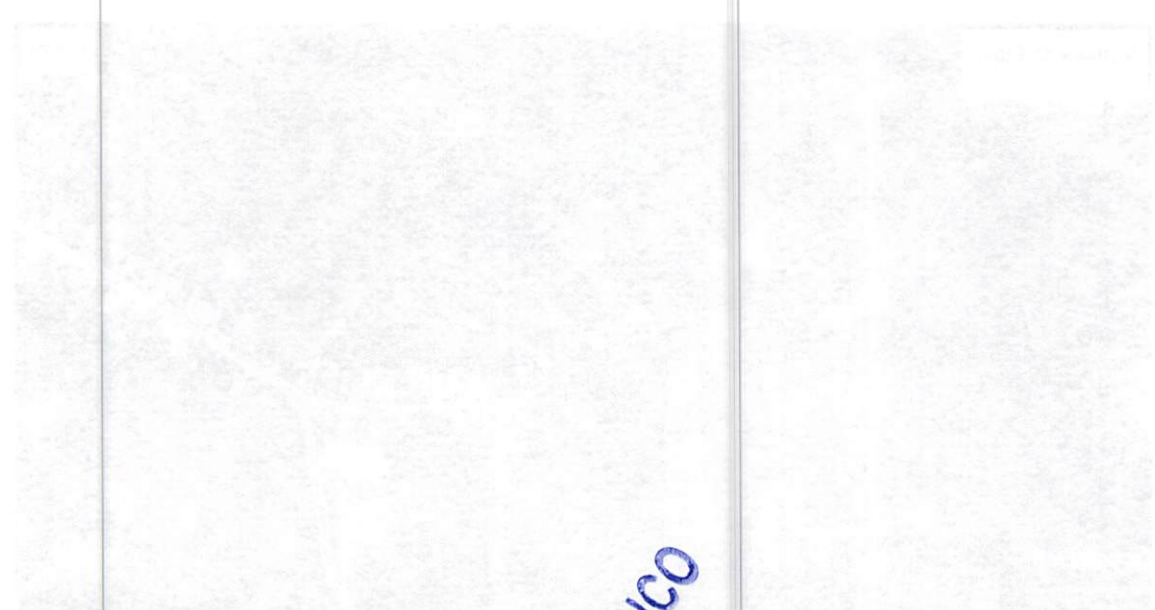

EM BRANCO

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO PIAUÍ

PROJETO: CODEVASF




RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Rua São Pedro

Santana do Piauí PI
84615-000
Brasil

Santana do Piauí PI
84615-000
Brasil

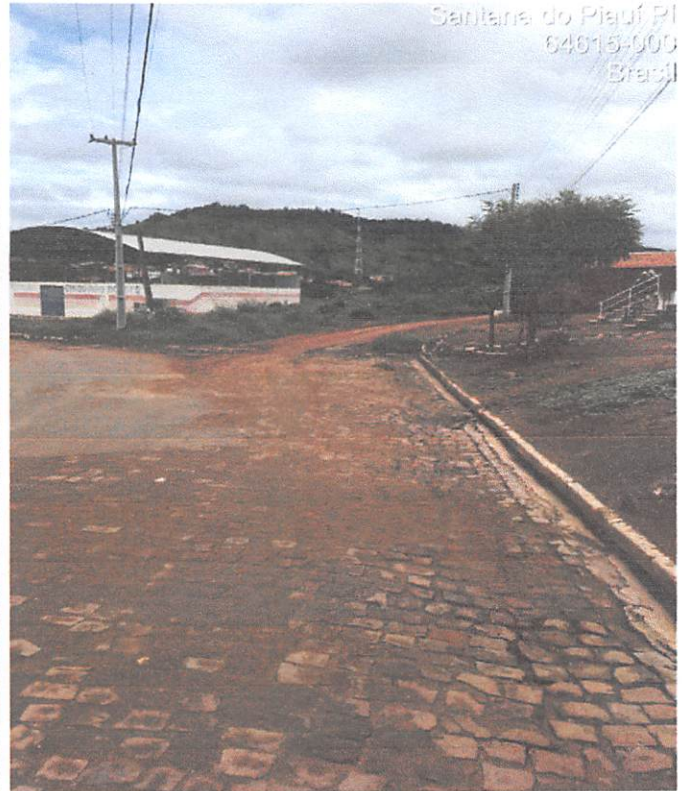

EM BRANCO
